

La fonction planning, deux fonctions derrière ce bouton : **Planning (correctif et préventif)**



1 - Afficher graphiquement les travaux correctifs à faire et clôturés ainsi que les travaux préventifs faits et à faire.

Les affichages se font par an et par mois. Pour le correctif, les dates prévues peuvent être déplacées. Il est possible de créer de nouveaux bons correctifs pour une date et de les clôturer. Pour le préventif on peut uniquement modifier les dates et le valider.

2 - Visualiser et faire le bilan en heures des travaux à la semaine

1 - AFFICHAGE DES TRAVAUX CORRECTIFS A FAIRE ET CLOTURES ET DES TRAVAUX PREVENTIFS FAITS ET A FAIRE

La fonction **Planning**

Elle comprend :

Deux plannings, correctif et préventif. Le correctif peut afficher les travaux clôturés ou non clôturés : 0 ou 1



On retrouve le plan préventif sur le formulaire préventif


Et depuis le formulaire PREVENTIF




PLANNING des travaux correctifs à faire sur le mois de janvier 2024 :

On peut voir jour par jour les Bons **correctifs fond bleu pâle** et en dessous les totaux par jour.

En tête en **Gris foncé** les Week end et jours fériés et en **gris** le fond pour les jours de congés (ex du 23 et 24/01)

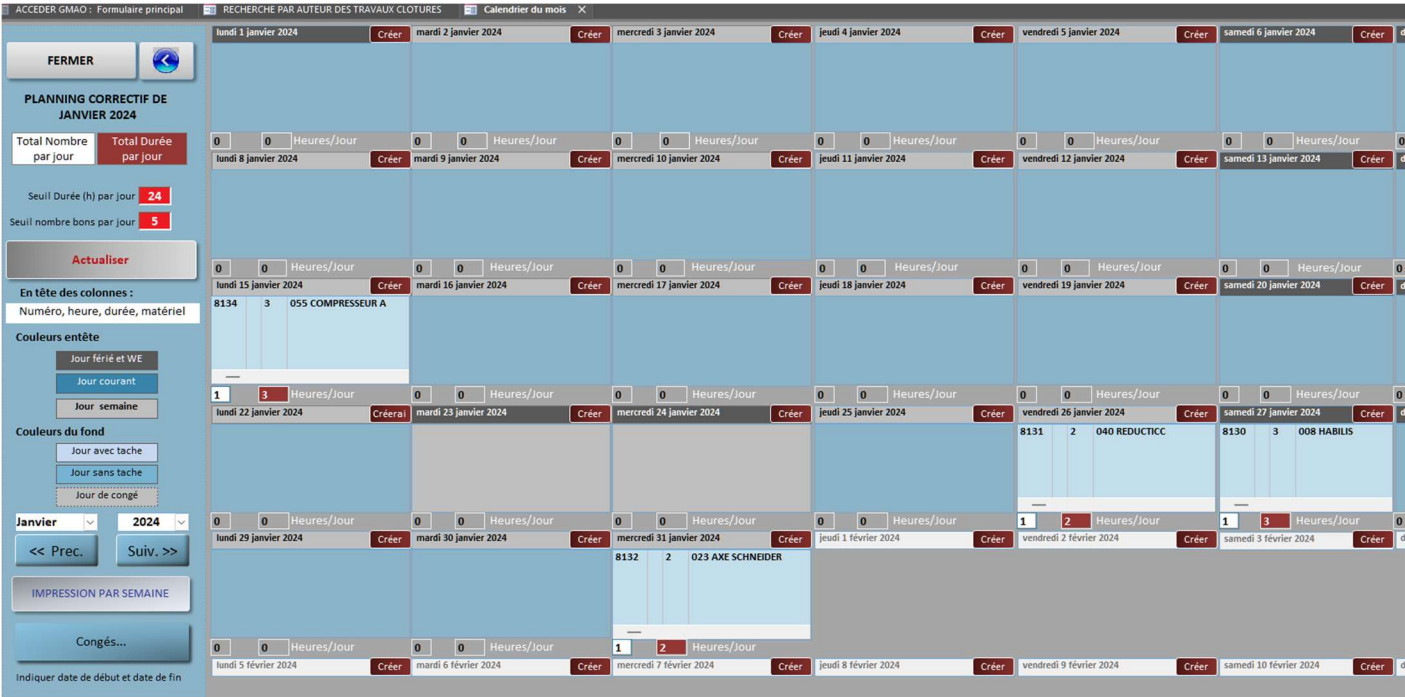

Pour avancer, reculer d'un mois



Affichage en haut des couleurs des totaux jour par jour



Des seuils pour mettre en évidence les jours où l'on trouve plus de bons de travaux que souhaité. Exemple ici moins de 25 h/jour et 3 bons, couleurs rouge



Pour mettre en évidence les jours où l'on trouve plus de temps de travail que souhaité. Exemple ici plus de 25 h/jour en rouge et 2 bons



Le pointage sur un bon correctif permet d'afficher le formulaire de demande de travaux, ici **Bon 15983** avec en plus des boutons pour déplacer la date de début

1 jour ou une semaine

Ici le bon 15983 va se déplacer dans le planning de plus un jour exemple :

mardi 5 décembre 2023				mercredi 6 décembre 2023			
16042	1	309 MÂGERLE	Créer	16048	0	270 BANC RODAGE	Créer
15983	6	320 MATRIX 2M		15983	6	320 MATRIX 2M	
1	1	Heures/Jour		2	6	Heures/Jour	

mardi 5 décembre 2023				mercredi 6 décembre 2023			
16042	1	309 MÂGERLE	Créer	16048	0	270 BANC RODAGE	Créer
15983	6	320 MATRIX 2M		15983	6	320 MATRIX 2M	
2	7	Heures/Jour		1	0	Heures/Jour	

Lorsque l'on est sur la demande de travail, on peut aussi basculer sur le bon de travail complet pour le clôturer ou le modifier

Résultat

Il est aussi possible de **Créer un nouveau bon correctif** avec le bouton rouge en haut de chaque jour

On retrouve le formulaire de demande de travaux avec la date du planning comme date de début

Exemple d’affichage des travaux **Préventifs** prévus sur le mois de février 2024 pour une société. Le fond des jours est en orange et la police est en **rouge** s’il y a du retard et en **Noir** si elle est à faire dans le mois

lundi 29 janvier 2024		mardi 30 janvier 2024		mercredi 31 janvier 2024		jeudi 1 février 2024		vendredi 2 février 2024	
						50	5 0,1	032 GALLIC 14	11 5 0,1
						1	0	Heures/Jour	1 0 Heures/Jour
lundi 5 février 2024		mardi 6 février 2024		mercredi 7 février 2024		jeudi 8 février 2024		vendredi 9 février 2024	
				7 6 0,2	002 ASCENSEUR	51 6 0,2	032 GALLIC 14		
0 0 Heures/Jour		0 0 Heures/Jour		1 0 Heures/Jour	1 0 Heures/Jour	0 0 Heures/Jour		0 0 Heures/Jour	
lundi 12 février 2024		mardi 13 février 2024		mercredi 14 février 2024		jeudi 15 février 2024		vendredi 16 février 2024	
				9 7 0,2	008 HABILIS				
0 0 Heures/Jour		0 0 Heures/Jour		1 0 Heures/Jour	0 0 Heures/Jour	0 0 Heures/Jour		0 0 Heures/Jour	
lundi 19 février 2024		mardi 20 février 2024		mercredi 21 février 2024		jeudi 22 février 2024		vendredi 23 février 2024	
0 0 Heures/Jour		0 0 Heures/Jour		0 0 Heures/Jour		0 0 Heures/Jour		0 0 Heures/Jour	
lundi 26 février 2024		mardi 27 février 2024		mercredi 28 février 2024		jeudi 29 février 2024		vendredi 1 mars 2024	
0 0 Heures/Jour		0 0 Heures/Jour		0 0 Heures/Jour		0 0 Heures/Jour		0 0 Heures/Jour	

Fonctionnalités similaires au formulaire du plan correctif avec une ouverture du bon préventif complet en pointant le numéro cela permet de valider ou de déplacer les travaux.

ACCEDER GMAO : Formulaire principal RECHERCHE PAR AUTEUR DES TRAVAUX CLOTURES Calendrier du mois FICHE PREVENTIVE

Création d'un bon correctif RECADRER SUPPRIMER MODIFIER VALIDER FERMER

Matériel BTP 172 TITRE - RESUME DES TRAVAUX
290 Mitsui 320 Centrale de graissage

Localisation 2 111 Vis
Catégorie Machine

Ajouter une ligne de travaux.

Observations (archivées avec les valeurs compteurs dans le formulaire Equipement)

Lien principal de documentation Lien principal

Auteur pour Affectation principale Mermet Jean-Michel Affecter un Auteur

Consulter les relevés des compteurs et les observations Enregistrer compteur et Observations

LISTE DES TRAVAUX A EFFECTUER LISTE DES PIECES PREVUES HISTORIQUE DES TRAVAUX PREVENTIF HISTORIQUE DES PIECES CHANGEES

Date de REALISATION DES TRAVAUX (date du jour, modifiable) mercredi 20 décembre 2023 51 Prochaine INTERVENTION PREVUE le mercredi 22 juin 2016 25

Dernière intervention réalisée le mardi 23 juin 2015 26 Cocher cette case (avant de valider), si les travaux ont provoqué des pertes de production

ELEMENT VISITE ET LIEN HYPERTEXTE TRAVAUX A EFFECTUER AUTEUR, DUREE ET DATE DE REALISATION, Pictogramme

Centrale de graissage ou Nettoyer l'échangeur à plaques Mermet Jean-Michel Travail réalisée 1,5 h 23/06/2015 0 26 RAZ

Nota : les plages limites sont identiques à celle du préventif, mais elles sont modifiables

PLANNING PREVENTIF DE JUIN 2016

Total Nombre par jour Total Durée par jour

Seuil Durée (h) par jour 10

Seuil nombre bons par jour 2

Actualiser

Les deux plannings disposent aussi d'un affichage sur Etat imprimable pour le mois en cours, classement par semaines

CORRECTIF

TRAVAUX CORRECTIFS		Mois : 12		Année : 2022		Lignalpes - 74800 Saint-Pierre-en-Fauc	
MATERIEL / E / BON CORRECTIF		ELEMENT / DECLARATION / TRAVAUX				DUREE/URGE	
SEMAINE		48					
samedi 3 décembre 2022							
KITAMURA HX 630G N°1		HYDRAULIQUE		1033 NIVEAU FAIBLE HUILE RÉFRIGÉRATION BROCHE		4,0 he	
0		24591		A nouveau cette alm, ça fait 3 WE de suite. L'alm apparait alors que le niveau est au milieu du voyant (hublot) sur la broche. Remis		ATT. ENT. EX	
dimanche 4 décembre 2022							
MCM N°1		ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE		DÉFAUT ARROSAGE M8		7,5 he	
0		24585		DF le 2.12.2022		ATT. PIECE	
SEMAINE		49					
mardi 6 décembre 2022							
MCM N°4		ARROSAGES		PROBLÈME DE DOSAGE D'HUILE AVEC L'EAU DE VILLE POUR L'APPOINT.		5,0 he	
0		24605		Mise en place d'un bac d'appoint de liqueur mère.		DEMANDE	

PREVENTIF

TRAVAUX PREVENTIFS			Mois : 12		Année : 2022		Lignalpes - 74800 Saint-Pierre			
BTP	MATERIEL	RESUME	PERIODE	FREQUENCE	AUTEUR	SEM.	PROCHAINE	DUREE	OBSERVATIONS	
SEMAINE		48								
209	PUMA 300MB	Préventif N2 M°O	ANNUELL		M20 FUSS Quent	48	01/12/2022	8	Préventif N2 M°O	
522	BULA TACCHIELLA	Préventif N2 M°O	ANNUELL		M20 Xavier B.	48	02/12/2022	5	Préventif N2 M°O	
612	KITAMURA HX 500 N°4	FB - Préventif annuel bac de relevage	2 ANS		F. BELLOCCIO	48	02/12/2022	2,5	FB - Préventif annuel bac d	
SEMAINE		49								
614	KITAMURA HX 630 N° 1	FB - Préventif annuel bac de relevage	2 ANS		F. BELLOCCIO	49	08/12/2022	2,5	FB - Préventif annuel bac d	
SEMAINE		50								
399	MCM N°2	Préventif N2 M°O	6 MOIS		M20 Maxime C.	50	15/12/2022	11	Préventif N2 M°O	
681	TRIBOFINITION ADP	FB-Préventif N2	2 MOIS		G. PEIFFER	50	15/12/2022	0,75	FB-Préventif N2	
720		PV_SAS_Préventif N2	ANNUELL			50	16/12/2022	1	PV_SAS_Préventif N2	
721	TRIBOFINITION PPM	PV_SAS_Préventif N2	ANNUELL			50	16/12/2022	1	PV_SAS_Préventif N2	
620	KITAMURA HX 630 N° 3	FB - Préventif annuel bac de relevage	2 ANS		Entretien	50	18/12/2022	2,5	FB - Préventif annuel bac d	

2 - VISUALISER ET FAIRE LE BILAN EN HEURES DES TRAVAUX A LA SEMAINE

Sur cette même page, vous disposez d’une fonction nouvelle : **Uniquement les travaux attribués à des auteurs.**
Les travaux correctifs et préventifs sont mélangés dans une même table (semaine par semaine)

De nombreuses combinaisons possibles Année, semaines et Auteurs

Effectuer une mise à jour en cas de changement de période

Année2024Semaine actuelle

Semaine55

Choix de L'Auteur

IMPRESSION DES TRAVAUX CORRECTIF PREVUS PAR AUTEURS

TRAVAUX CORRECTIF
UNE SEMAINE TOUS LES AUTEURS

TRAVAUX CORRECTIF
UNE SEMAINE UN AUTEUR

CALENDRIERS DES PREVISIONS BONS DE TRAVAUX PREVENTIFS

Planning préventif

Le planning est établi à partir de la date prévue.
Modification possible des dates et validation du travail

Prochaine échéance à moins de : 30 Jours

Prochaine échéance dépassée de plus de : 0 Jours

CALENDRIERS DES PREVISIONS BONS DE TRAVAUX CORRECTIFS

Planning correctif

Prévisions0

Réalisations1

Le planning est établi à partir de la date de début des travaux
Modification possible des dates et du contenu
Création possible des demandes de travaux
Accès au formulaire de clôture

TOTAL DES HEURES

AUTEUR	C	P	T
BOURDILLA LOUIS	1,0	5,0	6,0
BOUELINAF HEDI	2,0	0,0	2,0
CORBON PHILIPPE	1,0	0,0	1,0
GROBOST MICKAEL	0,0	0,0	0,0
FLORIAN	0,0	0,0	0,0
CICHY PAUL	0,0	0,0	0,0
2 XAVIER	0,0	0,0	0,0

RECHERCHE PAR SEMAINE ET CUMUL DES TRAVAUX CORRECTIFS ET PREVENTIFS PAR AUTEURS

Dans les bons correctifs : Les recherches cumulées se font sur DATES des travaux affectés aux Auteurs, pas sur les dates de début des travaux sur le bon correctif

Les boutons ci-dessous permettent de cumuler plusieurs semaines pour cette recherche en modifiant le numéro de semaine : ne pas Actualiser ensuite

Actualiser

Vider la liste des travaux

0 Prévisions

Ajouter prévisions semaine (C+P)

5

1 Réalisations

Ajouter réalisations semaine (C+P)

5

BILANHoraire GROUPE
DES TRAVAUX PAR AUTEURS

BILANHoraire LISTE
DES TRAVAUX PAR AUTEURS

Pointer le numéro pour voir la fiche corrective ou préventive

(C+P) = Travaux correctifs et préventifs

T	E	SEM	NBT	TEMPSC	NBTP	TEMPSP	AUTEUR	MATERIEL	DATES	ELEMENT	EFFET	ELEMENTS	RESUME
P	0	5		0,0	9	0,0	GROBOST MICKAEL	008 HABILIS	mardi 30 janvier 2024			2 MOTEUR	NETTOYAGES
P	1	5		0,0	54	0,0	FLORIAN	015 M	mercredi 31 janvier 2024			1 - DEMONTAGE DES BOUCHONS	ÉCHANGE STANDARD DE JOINTS SUR CONTRE
P	1	5		0,0	47	1,0	BOURDILLA LOUIS	033 EXTRUDICC	mercredi 31 janvier 2024			NETTOYAGES	REDUCTEUR ORTHOBLOC - ROUEMENTS ARB
P	1	5		0,0	47	4,0	BOURDILLA LOUIS	033 EXTRUDICC	mercredi 31 janvier 2024			REDUCTEUR ORTHOBLOC	REDUCTEUR ORTHOBLOC - ROUEMENTS ARB
C	1	5	7766	1,0		0,0	BOURDILLA LOUIS	002 ASCENSEUR	mercredi 31 janvier 2024		DISPOSITIF D'EN' CHANGER LE CAOUTCHOUC D'ENTRAINEMENT DE LA F		
P	0	5		0,0	50	0,0	2 XAVIER	032 GALLIC 14	jeudi 1 février 2024			1 - CHARIOT PORTE OUTIL	GRAISSAGES - SECURITES - NETTOYAGES BAC
C	0	5	8132	2,0		0,0	BOUELINAF HEDI	023 AXE SCHNEIDER	jeudi 1 février 2024	_ENSEMBLE	VIBRATION EN FIN DE COURSE		
P	0	5		0,0	11		CICHY PAUL	012 PESAGE	vendredi 2 février 2024			ARMOIRE ELECTRIQUE	NETTOYAGES
C	1	5	7766	1,0		0,0	CORBON PHILIPPE	002 ASCENSEUR	dimanche 4 février 2024		DISPOSITIF D'EN' CHANGER LE CAOUTCHOUC D'ENTRAINEMENT DE LA F		

Une partie de la liste affiche les bons correctifs et préventifs.
En Vert ou rouge les travaux réalisés ou prévus

P pour les préventifs



C pour les correctifs



En pointant sur le numéro du bon on affiche :

Le bon correctif

7766

Le bon préventif

50

Dans la partie droite :

L'élément et le signalment du correctif l'élément et le titre du préventif

Pointer le numéro pour voir la fiche corrective ou préventive										(C+P) = Travaux correctifs et préventifs			
T	E	SEM	NBT	TEMPSC	NBTP	TEMPSP	AUTEUR	MATERIEL	DATES				
P	1	5		0,0	54	0,0	FLORIAN	015 M	mercredi 31 janvier 2024				
P	1	5		0,0	47	1,0	BOURDILLA LOUIS	033 EXTRUDICC	mercredi 31 janvier 2024				
P	1	5		0,0	47	4,0	BOURDILLA LOUIS	033 EXTRUDICC	mercredi 31 janvier 2024				
C	1	5	7766	1,0		0,0	BOURDILLA LOUIS	002 ASCENSEUR	mercredi 31 janvier 2024				
P	0	5		0,0	50	0,0	2 XAVIER	032 GALLIC 14	jeudi 1 février 2024				
C	0	5	8132	2,0		0,0	BOUELINAF HEDI	023 AXE SCHNEIDER	jeudi 1 février 2024				
P	0	5		0,0	11		CICHY PAUL	012 PESAGE	vendredi 2 février 2024				
C	1	5	7766	1,0		0,0	CORBON PHILIPPE	002 ASCENSEUR	dimanche 4 février 2024				

ELEMENT	EFFET	ELEMENTS	R
		1 - DEMONTAGE DES BOUCHONS	ÉCHANGE STANDARD
		NETTOYAGES	REDUCTEUR ORTHOB
		REDUCTEUR ORTHOBLOC	REDUCTEUR ORTHOB
DISPOSITIF D'EN' CHANGER LE CAOUTCHOUC D'ENTRAINEMENT DE LA F			
		1 - CHARIOT PORTE OUTIL	GRAISSAGES - SECUR
_ENSEMBLE	VIBRATION EN FIN DE COURSE		
		ARMOIRE ELECTRIQUE	NETTOYAGES
DISPOSITIF D'EN' CHANGER LE CAOUTCHOUC D'ENTRAINEMENT DE LA F			

Effectuer une mise à jour en cas de changement de période

Année Semaine actuelle

Semaine

Choix de L'Auteur

Actualiser Vider la liste des travaux

Vous ne pouvez modifier le contenu d'un bon que sur la semaine courante avec ACTUALISER en sortant du bon

Ajouter prévisions semaine (C+P) 6

Ajouter réalisations semaine (C+P) **6**

Pointer le numéro pour voir la fiche correctrice ou pro

	T ▾	E ▾	SEM ▾	NBT ▾	TEMPSC ▾	NBTP ▾
	P	1	5		0,0	54
	P	1	5		0,0	47
	P	1	5		0,0	47
	C	1	5	7766	1,0	
	P	0	5		0,0	50
	C	0	5	8132	2,0	
	P	0	5		0,0	11
	C	1	5	7766	1,0	
	P	0	6		0,0	7
	P	0	6		0,0	51

[illegible]

Exemple d'impression récapitulative
de la liste affichée

TRAVAUX CORRECTIFS ET PREVENTIFS PAR AUTEURS

Lycée Louis LACHENAL - ANNECY 74

SEMAINE	5	2024	C Correctif	0 Prévisions	Total semaine CORRECTIF	4,0 heures
			P Préventif	1 Réalisations	Total semaine PREVENTIF	5,0 heures
					Total semaine	9,0 heures
2 XAVIER			Total CORRECTIF (h)		0,0	Total PREVENTIF (h) 0,0
jeudi 1 février 2024			BT		BTP	
P	0	032 GALLIC 14		0,0	50	GRAISSAGES - SECURITES 1 - CHARIOT P 0,0
BOUELINAF HEDI			Total CORRECTIF (h)		2,0	Total PREVENTIF (h) 0,0
jeudi 1 février 2024			BT		BTP	
C	0	023 AXE SCHNEIDER 8132	VIBRATION EN FIN DE CO	2,0		0,0
BOURDILLA LOUIS			Total CORRECTIF (h)		1,0	Total PREVENTIF (h) 5,0
mercredi 31 janvier 2024			BT		BTP	
C	1	002 ASCENSEUR 7766	CHANGER LE CAOUTCHOU	1,0		0,0
P	1	033 EXTRUDICC		0,0	47	REDUCTEUR ORTHOBLOC NETTOYAGES 1,0
P	1	033 EXTRUDICC		0,0	47	REDUCTEUR ORTHOBLOC REDUCTEUR O 4,0
CICHY PAUL			Total CORRECTIF (h)		0,0	Total PREVENTIF (h) 0,0
vendredi 2 février 2024			BT		BTP	
P	0	012 PESAGE		0,0	11	NETTOYAGES ARMOIRE ELEC 0,0
CORBON PHILIPPE			Total CORRECTIF (h)		1,0	Total PREVENTIF (h) 0,0
dimanche 4 février 2024			BT		BTP	
C	1	002 ASCENSEUR 7766	CHANGER LE CAOUTCHOU	1,0		0,0
FLORIAN			Total CORRECTIF (h)		0,0	Total PREVENTIF (h) 0,0
mercredi 31 janvier 2024			BT		BTP	
P	1	015 M		0,0	54	ÉCHANGE STANDARD DE 1 - DEMONTA 0,0
